


NORDR

Informationsblad Veddestaden v.10/11-22



NORDR

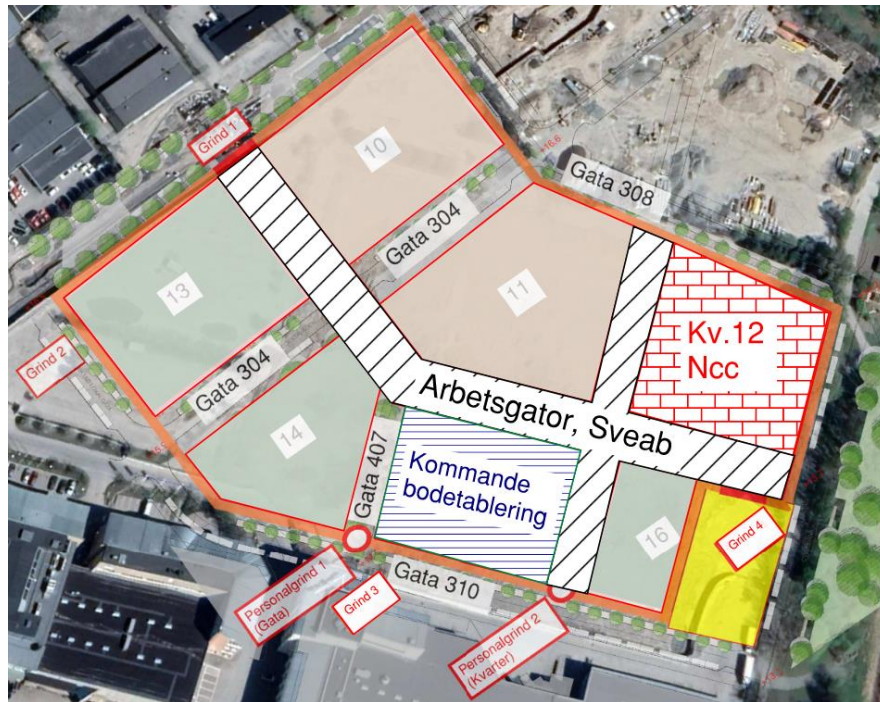

Då är det fredag, och idag har vi strålande sol igen. Vi ser alla fram emot lite vila efter en vecka i full fart,

Det som har startats denna på byggarbetsplatsen är att NCC har börjat med små gjutningar. (sista bilden, bottenplattan till sopsugen)

Sveab har denna vecka att förutom den vanliga VA-förläggningen även att fortsätta med att dra in fjärrvärme från Ekonomivägen till kv.12 Anledningen till att detta dras in redan nu även om det är långt tills det är dags för dom första inflyttningarna, är att byggnaderna kommer värmas upp under byggskedet med fjärrvärme då det skulle vara allt för energikrävande att göra detta med elektricitet.


Ncc är klara med att lasta ut allt berg och pålningsarbetet fortgår numera med två st pålningsmaskiner. Detta kommer att hålla på i ca 2veckor till. Efter det kommer arbetet med betonggjutningarna att starta.

Tornkransmontaget kommer att starta och slutföras v13.

Inom Nordr's område har vi kontrakterat två stycken entreprenörer:

- Ncc som kommer bygga två stycken bostadsrättsföreningar i kvarter 12
- Sveab har fått uppdraget att bygga ut arbetsgatorna inom området. Till detta hör att förlägga allt vatten/avlopp, fiber, fjärrvärme osv som senare kommer behövas för dom olika kvarteren

NORDR

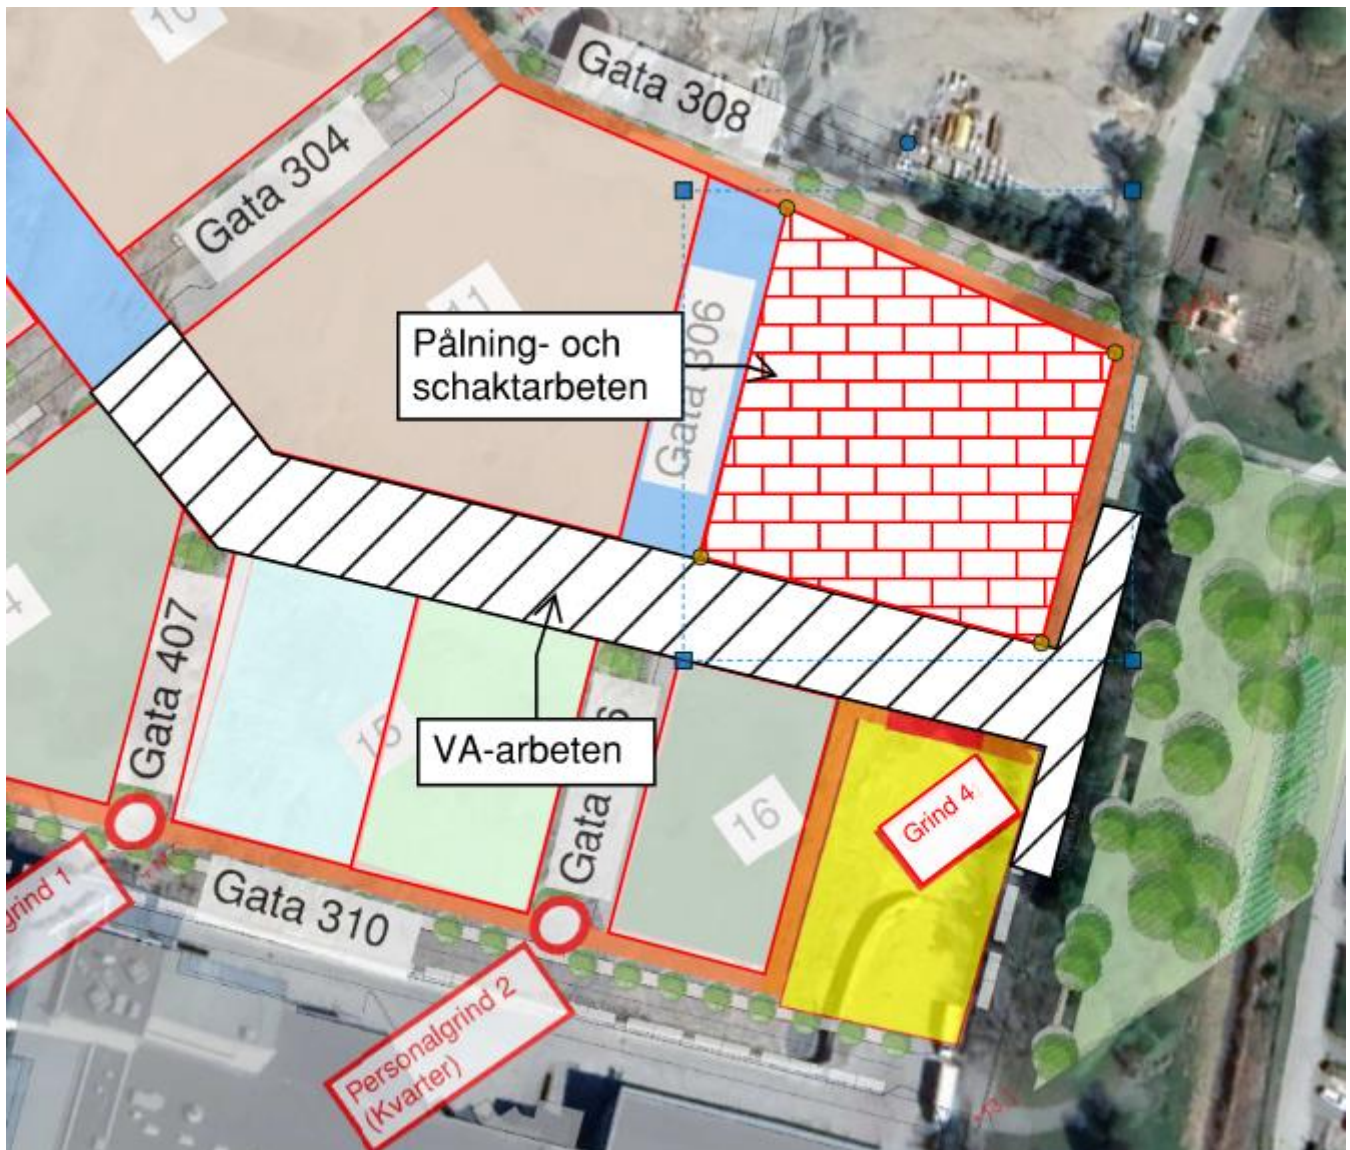

Kommande veckas arbeten:


Ncc:

- Pålning av bottenplatta, (borrade pålar) (2st pålmaskiner)
- Ncc kommer arbeta fram till kl. 18:00 kommande vecka.
- Ncc kommer att fortsätta att göra mindre gjutningar.

Sveab:

- Sveab kommer arbeta med va-förläggning i längsmed den södra delen av den nya gatan genom området.
- Avstängning av delar av gångbanan.
- Fjärrvärmearbetet från Ekonomivägen är i stort sett klart, efter det påbörjas fjärrvärmearbetet uppe vid Veddestavägen
- Sveab kommer denna vecka att arbeta fram till kl 16:00.

NORDR

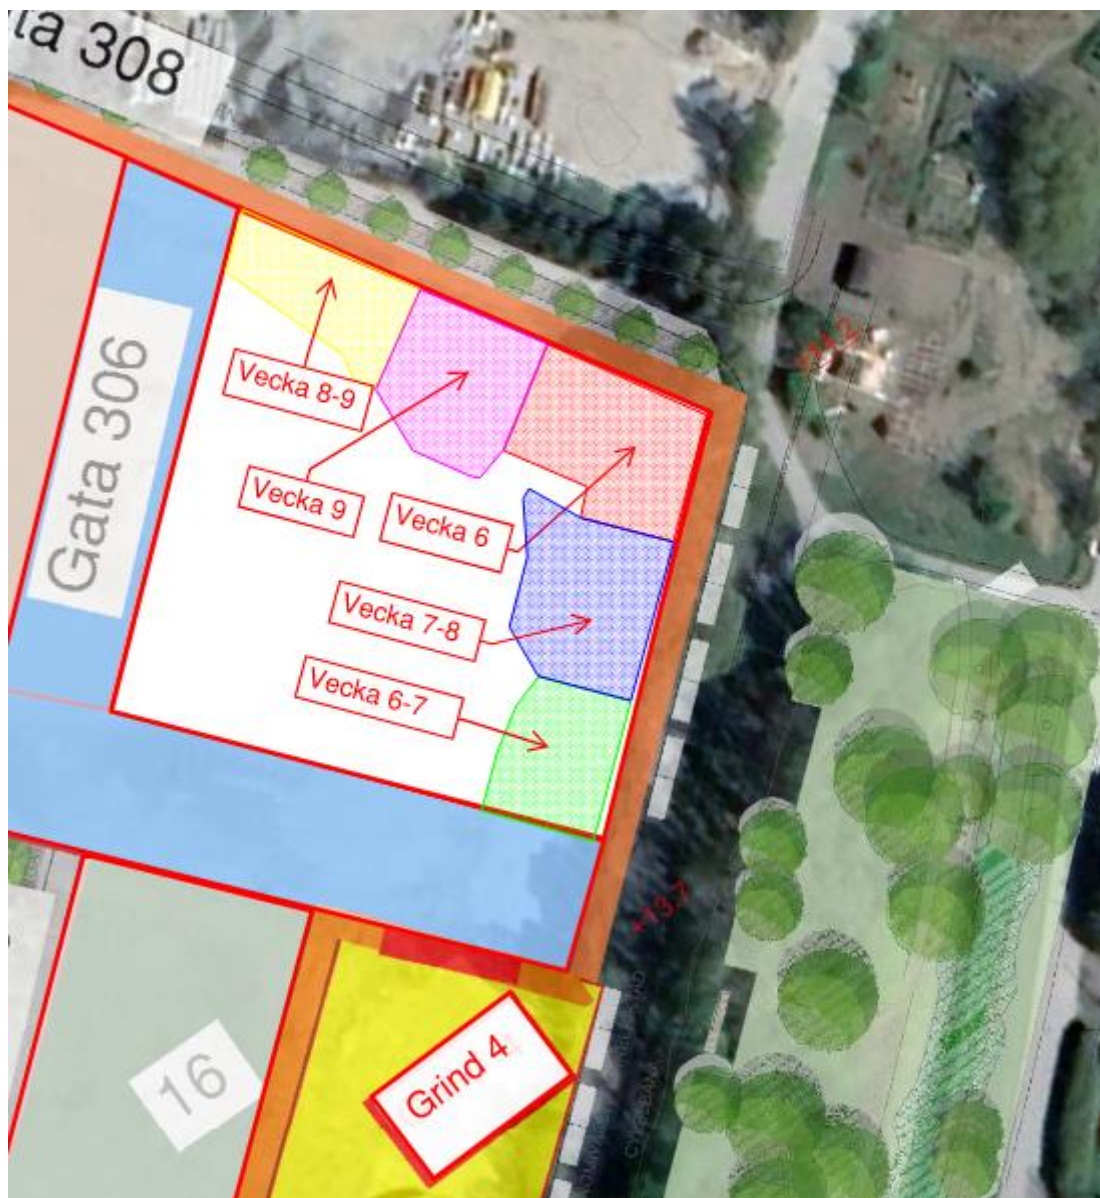

Markförstärkningar med borrade stålplålar kommer att hålla på i ca 2veckor till.

Bilder från den gångna veckan

NORDR



NORDR



NORDR

